

Краткое описание плана работ (июнь 2025 г. – август 2026 г.)

Завершение разработки прототипа второй версии (июнь – август 2025 г.)

Отчет о ходе реализации пилотного проекта CATS/ICE (сентябрь 2025 г.)

Работа со страховщикам и и гарантами (сентябрь 2025 г.)

Параллельное испытание вместе с торговыми операторами и страховщиками (октябрь 2025 г.)

Разработка прототипа третьей версии и проведение испытаний на соответствие (ноябрь 2025 г. – май 2026 г.)

Подписание и ратификация Многосторонне го соглашения (январь – июнь 2026 г.)

Проведение испытаний в реальных условиях (июль – август 2026 г.)

Заседания технической рабочей группы (ТРГ), координационные встречи, Учебные сессии по наращиванию потенциала, присоединение стран, не являющихся участниками (сентябрь 2025 г. – по настоящее время)

Нормативно-правовая база

А. Нормативно-правовая база: подписание и ратификация Многостороннего соглашения и внесение изменений в национальное законодательство и нормативно-правовые акты, при необходимости

А.1 Поддержка проведения национальных юридических экспертиз (июнь 2025 г. – июнь 2026 г.)

- Поддержка проведения национальных юридических экспертиз Многостороннего соглашения.
- Проведение специализированного обучения по юридическим/нормативным вопросам.
- Оказание технической помощи в приведении национальных текстов нормативно-правовых положений в соответствие с положениями соглашения.

А.2 Подписание и ратификация Многостороннего соглашения (январь – июнь 2026 г.)

- Повышение осведомленности политиков в целях ускорения подписания и ратификации.
- Поддержка получения одобрения Парламента/Кабинета министров в Азербайджане, Грузии и Узбекистане.
- Мониторинг сроков подписания и ратификации.

Технология CATS/ICE

В. Технология CATS/ICE: усовершенствование прототипа ПО с учетом новых требований пользователей

В.1 Доработка прототипа второй версии (июнь – август 2025 г.)

- Включение запланированных запросов на изменения, полученных в ходе испытаний.

В.2 Параллельное испытание прототипа второй версии с грузами МДП (сентябрь – октябрь 2025 г.)

- Использование реальных данных в CATS/ICE о перемещении грузов МДП.
- Привлечение таможенных органов, страховщиков/гарантов и торговых операторов к испытаниям.
- Проверка/верификация процедур, обмена информацией и производительности системы.

В.3 Доработка прототипа третьей версии (ноябрь 2025 г. – май 2026 г.)

- Подготовка общих спецификаций системы.
- Учет уроков/запросов на изменения, полученных в ходе испытаний прототипа второй версии.

В.4 Испытание на соответствие прототипа третьей версии (апрель – май 2026 г.)

- Испытание на соответствие общим системным спецификациям.
- Привлечение таможенных органов и заинтересованных сторон от частного сектора.
- Проведение испытаний в стрессовых условиях для оценки производительности системы при пиковых нагрузках.
- Подтверждение соответствия и эксплуатационной готовности.

В.5 Испытание с реальными грузами (эксплуатационные испытания) с использованием прототипа третьей версии (июль – август 2026 г. – зависит от подписания и ратификации Многостороннего соглашения)

- Обработка транзитных перевозок в режиме реального времени в CATS/ICE.
- Сбор отзывов от всех заинтересованных сторон для следующего этапа улучшений и доработок.
- Оценка эффективности, производительности, надежности и безопасности/защиты системы.

Консультации с заинтересованными сторонами

С. Консультации с заинтересованными сторонами: привлечение таможенных органов, страховщиков и торговых операторов

С.1 Консультации с заинтересованными сторонами (очные встречи и видеоконференции) (сентябрь – октябрь 2025 г.)

- Проведение консультаций с назначенными участниками ВЭД.
- Доработка механизмов перестрахования и фронтингования.
- Демонстрация функционала CATS/ICE.

С.2 Заседание рабочей группы (очное) (сентябрь 2025 г.)

- Обзор прогресса и обсуждение вопросов развертывания.
- Укрепление координации между таможенными администрациями.

С.3 Отчет о ходе работ на заседании КТС (очное) (сентябрь 2025 г.)

- Официальное предоставление последней информации о ходе пилотной реализации.
- Информирование о плане работ на 2025–2026 гг. и долгосрочной дорожной карте.

С.4 Заседание рабочей группы и заинтересованных сторон (очное) (март 2026 г.)

- Обзор хода работ и оценка готовности к заключительным испытаниям на соответствие и опытной эксплуатации.
- План проведения испытаний в реальных условиях.
- Выявление и устранение юридических/технических/эксплуатационных пробелов.

С.5 Взаимодействие с NCTS, ACTS и другими системами (апрель 2026 г. – по настоящее время)

- Налаживание официального сотрудничества с транзитными системами ЕС/АСЕАН и другими странами.
- Обмен техническими знаниями и передовым опытом.
- Изучение возможностей синергии.

Обучение и наращивание потенциала

D. Обучение и наращивание потенциала: проведение регулярного обучения

D.1 Подготовка/обновление учебных материалов (сентябрь 2025 г. и март 2026 г.)

- Разработка руководств по нормативно-правовой базе, процедурам CATS и ИТ-операциям.
- Вводное обучение для сотрудников таможенных служб и пользователей от частного сектора.

D.2 Обучение пользователей на прототипе второй версии 2 (онлайн) (сентябрь – октябрь 2025 г.)

- Обучение сотрудников таможенных служб и заинтересованных сторон от частного сектора на прототипе второй версии и процедурам параллельных испытаний.
- Повышение практической уверенности при использовании системы.

D.3 Обучение на прототипе третьей версии (онлайн) (апрель 2026 г.)

- Ознакомление сотрудников таможни с общими спецификациями системы и испытаниями на соответствие.
- Обучение сотрудников таможни и заинтересованных сторон от частного сектора на прототипе третьей версии и процедурам испытаний на соответствие.

D.4 Обучение на прототипе третьей версии (онлайн) (июнь 2026 г.)

- Проведение практического обучения по процедурам испытаний в реальных условиях эксплуатации для таможенных и заинтересованных торговых операторов.
- Повышение готовности заинтересованных сторон к эксплуатации в реальных условиях.

Оценка и анализ

Е. Оценка и анализ: отчетность по видам работ и испытаниям

Е.1 Отчет о параллельных испытаниях (прототип второй версии) (октябрь 2025 г.)

- Документирование результатов/уроков и выявление сильных/слабых сторон.
- Регистрация запросов на изменения.

Е.2 Отчет об испытаниях на соответствие (прототип третьей версии) (май 2026 г.)

- Составление отчета о результатах испытаний на соответствие.
- Рекомендации по исправлению ошибок до начала испытаний в реальных условиях.

Е.3 Отчет о эксплуатационных испытаниях в реальных условиях (прототип третьей версии) (август 2026 г.)

- Оценка обработки и производительности данных в режиме реального времени.

Е.4 Отчет о ходе выполнения работ и его рассылка (январь 2026 г. и август 2026 г.)

- Обобщение результатов работы и извлеченных уроков.
- Распространение среди стран-членов ЦАРЭС, на заседаниях ТРГ и КТС

Расширение CATS/ICE

Г. Расширение CATS/ICE: продвижение CATS/ICE в остальных странах ЦАРЭС

Г.1 Развертывание CATS/ICE *(сентябрь – декабрь 2025 г.)*


- Ознакомительные и демонстрационные сессии для неучаствующих стран.
- Подготовка «Руководства/справочника по присоединению».

Г.2 Обучение новых участников *(ноябрь 2025 г. – март 2026 г.)*

- Проведение обучения по юридическим, процедурным и ИТ-вопросам для стран-кандидатов.

Г.3 Поддержка официального присоединения *(январь – август 2026 г.)*

- Сопровождение/помощь странам в процессе присоединения на основе «Руководства/справочника по присоединению»

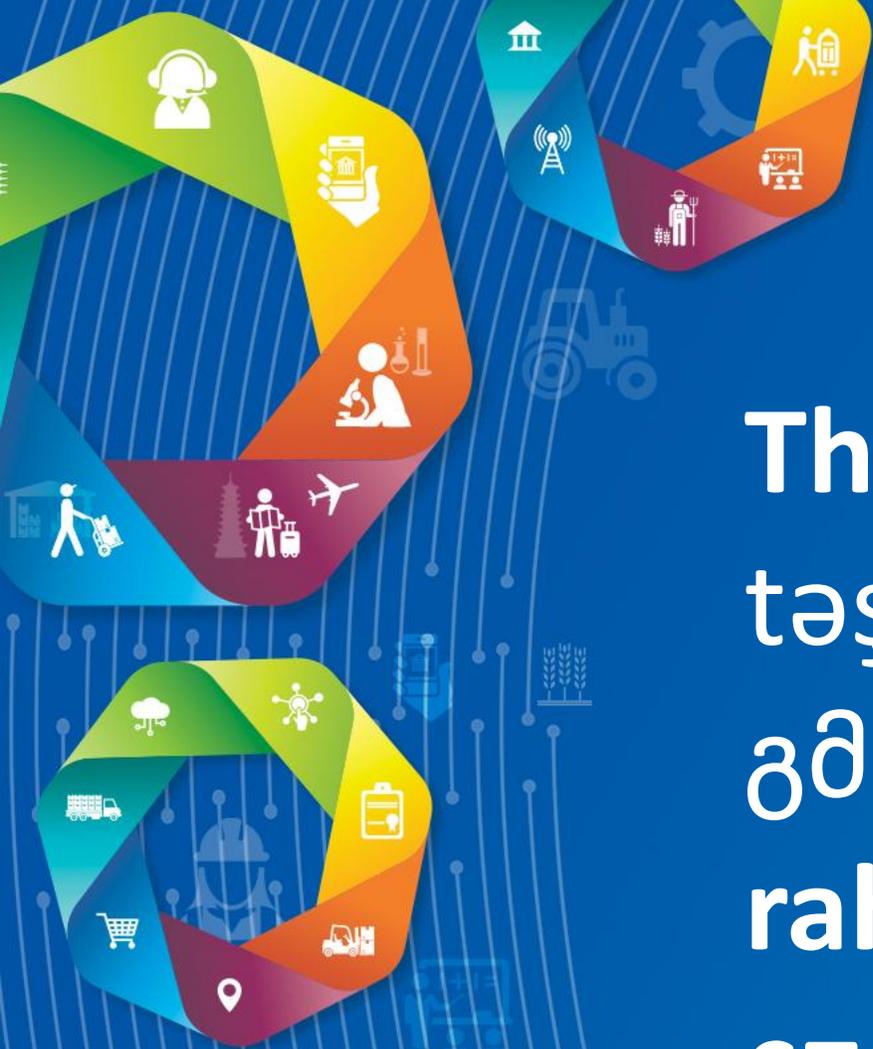

Thank you
თაშაკურედირამ
გმადლობთ
rahmat
спасибо
